


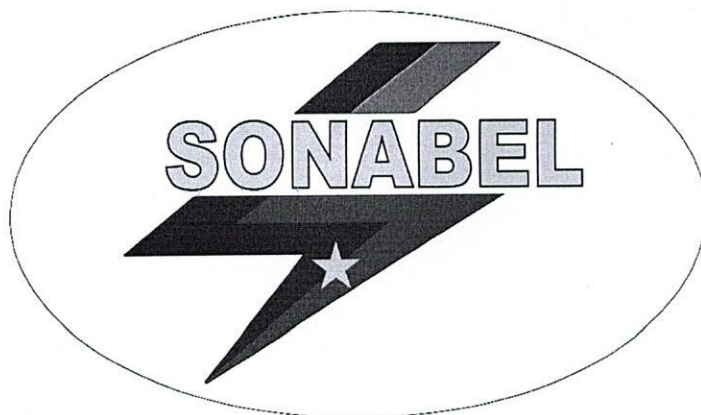

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA
www.sonabel.bf

PLAN DE PASSATION DES MARCHES EXERCICE 2024 – REVISE -

Septembre 2024

PRESENTATION DU PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) 2024

I-Introduction

Conformément aux dispositions des articles 48 et 49 du décret n° 2017-0049/PRES/PM/ MINEFID portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, les marchés publics doivent être inscrits au préalable dans un Plan annuel de Passation des Marchés (PPM). Ce plan regroupe les besoins exprimés par les différents services, les procédures d'acquisition prévues ainsi que les périodes d'exécution des marchés.

II-Présentation du PPM 2024

Le plan de passation des marchés de 2024 de la SONABEL est fortement marqué par la prise en compte de l'arrêté n°2023-461 MEFP/CAB portant détermination des prestations spécifiques et procédures applicables du 08 septembre 2023, notamment en son article 5 qui élargit les prestations spécifiques à certains biens et services entrant dans le cœur de métier des Sociétés d'Etat (SE). Ainsi, les acquisitions de biens et service figurant sur cette liste pourront être faites par la procédure d'entente directe (ED).

Le montant total des acquisitions de biens et services extrait du budget général et inscrit dans le Plan de Passation des Marchés 2024 s'élève à 213 527 108 224 FCFA décomposé comme suit :

- **43 385 717 226 FCFA** au titre du budget d'investissement sur fonds propres pour **71 dossiers** de passation de marchés ;
- **81 944 901 859 F CFA** au titre du budget d'investissement sur financements extérieurs, qui font l'objet de 24 dossiers de passation de marchés ;
- **88 196 489 139 F CFA** au titre du budget d'exploitation fonds propres pour **31 dossiers** de passation de marchés.

Le détail est présenté dans le tableau 1 suivant :

Tableau 1 : synthèse PPM 2024

Mode de Passation		Investissements sur fonds propres		Investissements sur financement extérieurs		Exploitation sur fonds propres		Total	
		Nombre de dossier	Montant en F CFA HTVA	Nombre de dossier	Montant en F CFA HTVA	Nombre de dossier	Montant en F CFA HTVA	Nombre de dossier	Montant en F CFA HTVA
Appel d'Offres Ouvert International (AOOI)		12	19 426 734 798	12	76 667 954 142	11	20 752 769 762	35	116 847 458 702
Appel d'Offres Ouvert (AOO)		31	10 522 497 852	7	2 397 492 466	4	1 464 469 725	42	14 384 460 043
Demande de Propositions (DP)		3	5 575 102 130	7	2 692 905 251		0	10	8 268 007 381
Appel d'Offres Restreint (AOR)		0	0	0	0	-	-		
Demande de Prix (DPX)		15	685 292 676	3	129 550 000	0	0	18	814 842 676
Demande de Propositions Allégée (DPA)		0	0	1	42 000 000	0	0	1	42 000 000
Demande de Cotation Formelle (DC/F)		7	54 800 000	1	15 000 000	0	0	8	69 800 000
Demande de Cotation Non Formelle (DC/NF)		0	0	0	-	0	0	0	
Entente Directe (ED)	Après autorisation du Bailleur de Fonds ou de la DGCMEF	0	0	0	0	0	0	0	0
	Prestations spécifiques	3	7 121 289 771	0	0	9	65 979 249 651	12	73 100 539 422
TOTAL		71	43 385 717 226	31	81 944 901 859	24	88 196 489 139	126	213 527 108 224

Source : Données du budget 2024

III- Révision du PPM 2024

La révision du PPM 2024 a concerné les investissements sur fonds propres et les charges d'exploitation.

III-1. Investissements sur fonds propres

Dans le cadre de la révision du PPM 2024, de nouveaux besoins d'investissements sur fonds propres sont apparus au cours de l'année au regard de l'évolution de l'exploitation et de l'environnement de la société.

Ainsi, 27 dossiers ont été inscrits pour un montant global de 52 955 297 318 F CFA.

Le PPM révisé, volet investissement sur fonds propres comporte ainsi **98 dossiers** pour un montant global de **96 341 014 544 F CFA**.

Le tableau suivant présent le détail des investissements révisés avec les procédures de passation des marchés :

Tableau 2: Synthèse des investissements sur fonds propres

Mode de Passation	Investissements sur fonds propres		Retrait Investissements sur fonds propres		Ajout Investissements sur fonds propres		Investissements sur fonds propres REVISE	
	Nombre de dossier	Montant en F CFA HTVA	Nombre de dossier	Montant en F CFA HTVA	Nombre de dossier	Montant en F CFA HTVA	Nombre de dossier	Montant en F CFA HTVA
Appel d'Offres Ouvert International (AOOI)	12	19 426 734 798	0		3	10 983 739 248	15	30 410 474 046
Appel d'Offres Ouvert (AOO)	31	10 522 497 852	0		13	8 047 973 751	44	18 570 471 603
Demande de Propositions (DP)	3	5 575 102 130	0		0	0	3	5 575 102 130
Appel d'Offres Restreint (AOR)	0	0	0		1	156 525 424	1	156 525 424
Demande de Prix (DPX)	15	685 292 676	0		5	525 615 831	20	1 210 908 507
Demande de Propositions Allégée (DPA)	0	0	0		0		0	0
Consultation de Consultant	0	0	0		0		0	0
Demande de Cotation Formelle (DC/F)	7	54 800 000	0		0		7	54 800 000
Entente Directe (ED)	0	0	0		0		0	0
	3	7 121 289 771	0		4	5 241 443 064	7	12 362 732 834
	0	0	0		1	28 000 000 000	1	28 000 000 000
TOTAL	71	43 385 717 226	0	0	27	52 955 297 318	98	96 341 014 544

III-2. Budget d'exploitation sur fonds propres

Dans le cadre de la révision du PPM 2024, de nouveaux besoins d'exploitation sur fonds propres sont apparus au cours de l'année au regard de l'évolution de l'exploitation et de l'environnement de la société.

Ainsi, **7 dossiers** ont été inscrits pour un montant global de **7 741 204 970 F CFA**.

Le PPM révisé, volet exploitation sur fonds propres comporte ainsi **31 dossiers** pour un montant global de **95 937 694 109 F CFA**.

Le tableau suivant présent le détail des investissements révisés avec les procédures de passation des marchés :

Tableau N°3 : Synthèse du Budget d'exploitation sur fonds propres

Mode de Passation	Exploitation sur fonds propres		Retrait Exploitation sur fonds propres		Ajout Exploitation sur fonds propres		Exploitation sur fonds propres REVISE	
	Nombre de dossier	Montant en F CFA HTVA	Nombre de dossier	Montant en F CFA HTVA	Nombre de dossier	Montant en F CFA HTVA	Nombre de dossier	Montant en F CFA HTVA
Appel d'Offres Ouvert International (AOOI)	11	20 752 769 762	0	0	0	0	11	20 752 769 762
Appel d'Offres Ouvert (AOO)	4	1 464 469 725	0	0	1	185 331 162	5	1 649 800 887
Demande de Propositions (DP)		0	0	0	0	0	0	0
Appel d'Offres Restreint (AOR)	-	-	0	0	0	0	0	0
Demande de Prix (DPX)	0	0	0	0	1	22 500 000	1	22 500 000
Demande de Propositions Allégée (DPA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Consultation de Consultant	0	0	0		1	10 140 000	1	10 140 000
Demande de Cotation Formelle (DC/F)	0	0	0	0	1	9 071 300	1	9 071 300
Entente Directe (ED)	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	65 979 249 651	0	0	3	7 514 162 508	12	73 493 412 159
	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	24	88 196 489 139	0	0	7	7 741 204 970	31	95 937 694 109

III-3. Budget d'investissements sur financements extérieurs

Le PPM révisé, volet d'investissements sur financements extérieurs n'a pas connu de changement avec la révision, comporte ainsi **31 dossiers** pour un montant global de **81 944 901 859 F CFA**.

Le tableau suivant ci-dessous présent le détail:

Tableau N°4 : Synthèse du Budget d'investissements sur financements extérieurs

Mode de Passation	Investissements sur financement extérieurs		Retrait Investissements sur financement extérieurs		Ajout Investissements sur financement extérieurs		Investissements sur financement extérieurs REVISE	
	Nombre de dossier	Montant en F CFA HTVA	Nombre de dossier	Montant en F CFA HTVA	Nombre de dossier	Montant en F CFA HTVA	Nombre de dossier	Montant en F CFA HTVA
Appel d'Offres Ouvert International (AOOI)	12	76 667 954 142	0	0	0	0	12	76 667 954 142
Appel d'Offres Ouvert (AOO)	7	2 397 492 466	0	0	0	0	7	2 397 492 466
Demande de Propositions (DP)	7	2 692 905 251	0	0	0	0	7	2 692 905 251
Appel d'Offres Restreint (AOR)	0	0	0	0	0	-	0	0
Demande de Prix (DPX)	3	129 550 000	0	0	0	-	3	129 550 000
Demande de Propositions Allégée (DPA)	1	42000000	0	0	0	0	1	42 000 000
Consultation de Consultant	0	0	0	0	0	0	0	0
Demande de Cotation Formelle (DC/F)	1	15000000	0	0	0	0	1	15 000 000
Entente Directe (ED)	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	-	0	0
	0	0	0	0	0	-	0	0
TOTAL	31	81 944 901 859	-	-	0	0	31	81 944 901 859

III-4. Budget général révisé

Le montant global du PPM révisé est de **274 223 610 511 F CFA** pour **160 dossiers** répartis comme suit :

- **96 341 014 544 F CFA** au titre du budget d'investissement sur fonds propres pour **98 dossiers** de passation de marchés ;
- **95 937 694 109 F CFA** au titre du budget d'investissement sur financements extérieurs, pour **31 dossiers** de passation de marchés ;
- **81 944 901 859 F CFA** au titre du budget d'exploitation fonds propres pour **31 dossiers** de passation de marchés.

Le PPM révisé est résumé dans le tableau suivant :

Tableau N°5 : Synthèse du PPM-2024- révisé

Mode de Passation		Total du PPM 2024		Retrait Total du PPM 2024		Ajout Total du PPM 2024		Total du PPM 2024 REVISE	
		Nombre de dossier	Montant en F CFA HTVA	Nombre de dossier	Montant en F CFA HTVA	Nombre de dossier	Montant en F CFA HTVA	Nombre de dossier	Montant en F CFA HTVA
Entente Directe (ED)	Appel d'Offres Ouvert International (AOOI)	35	116 847 458 702	0	0	3	10 983 739 248	38	127 831 197 950
	Appel d'Offres Ouvert (AOO)	42	14 384 460 043	0	0	14	8 233 304 913	56	22 617 764 956
	Demande de Propositions (DP)	10	8 268 007 381	0	0	0	0	10	8 268 007 381
	Appel d'Offres Restreint (AOR)			0	0	1	156 525 424	1	156 525 424
Entente Indirecte (EI)	Demande de Prix (DPX)	18	814 842 676	0	0	6	548 115 831	24	1 362 958 507
	Demande de Propositions Allégée (DPA)	1	42 000 000	0	0	0	0	1	42 000 000
	Consultation de Consultant	0	0	0	0	1	10 140 000	1	10 140 000
	Demande de Cotation Formelle (DC/F)	8	69 800 000	0	0	1	9 071 300	9	78 871 300
Entente Indirecte (EI)	Après autorisation du Bailleur de Fonds ou de la DGCMEF	0	0	0	0	0	0	0	0
	Prestations spécifiques	12	73 100 539 422	0	0	7	12 755 605 572	19	85 856 144 994
	Mesures d'urgences	0	0	0	0	1	28 000 000 000	1	28 000 000 000
	TOTAL	126	213 527 108 224	0	0	34	60 696 502 287	160	274 223 610 511



Plan de Passation des Marchés 2024 révisé

I. BUDGET D'INVESTISSEMENT FONDS PROPRES 2024 - Révisé-


N° ORDRE	CENTRE BUDGETAIRE	Montant de l'inscription budgétaire en F CFA HTVA (1)	Montant des dépenses engagées non liquidées en F CFA HTVA (2)	Disponible en F CFA HTVA (3) = (1) - (2)	Nature des prestations (objet du contrat en perspective)	Type de Prestation	Type de Prestation	Réf. du Dossier d'Appel à Concurrence	PUBLICATION DE L'AVIS		Date réelle ouverture des offres	Date de démarrage		Délai d'exécution / en jours	Date butoir	Observations
									Date prévue PPM	Date prévue		Date prévue	Date prévue			
1	DP	38 450 000		38 450 000	Acquisition diverses armoires et étagères de rangement	Fourniture	DPX	AO N°045 en 06 lots	30/03/2024			30/05/2024	90		28/08/2024	DAO en signature
2	DCME	141 580 359		141 580 359	Acquisitions et aménagements de conteneurs	Fourniture	AO	DPAN° 024/24	30/03/2024	02/05/2024		30/05/2024	90		28/08/2024	Marché en cours d'exécution
3	DSEM	32 000 000		32 000 000	Construction de passerelle d'accès / surposition des conteneurs en hauteur de 2	Travaux	DPX	DPX N° 021/2024	30/03/2024	22/07/2024		30/05/2024	90		28/08/2024	Marché en signature
4	PT-KOSSODO 1	253 000 000		253 000 000	Remplacement des cellules et disjoncteurs 33 kV du GI de KOSSODO 1	Fourniture	AO	AO 14/2024	30/03/2024	30/05/2024		15/07/2024	150		12/12/2024	Analyse en cours
5	DPTAC	1 648 035 322		1 643 035 322	Acquisition de divers équipements pour les groupes et auxiliaires des centrales	Fourniture	AOI	AO 027/2024	30/03/2024			15/07/2024	150		12/12/2024	Marché en cours d'exécution
6	DPTAC	1 195 000 000		1 195 000 000	Acquisition de rotors et de refroidisseur d'air de suralimentation pour deux groupes de la nouvelle centrale	Fourniture	AOI	AOI 024/2024	30/03/2024	15/05/2024		15/07/2024	150		12/12/2024	Marché en signature
7	DIRS	80 000 000		80 000 000	Câblage réseau sur plusieurs sites à Ouagadougou	Travaux	DPX	DPX N° 007/2024 en 03 lots	30/03/2024	N/D		15/07/2024	90		13/10/2024	Marché en cours d'exécution
8	DS	26 600 000		26 600 000	Acquisition d'une caisse à outil équipée de clés pour l'exploitation	Fourniture	DPX	AO 030/2024	30/03/2024	N/D		30/05/2024	120		27/10/2024	Marché en cours d'exécution
9	DP	307 967 800		307 967 800	Acquisition de Matériels et Mobiliers de bureau	Fourniture	AO	AO 45 en 03 Lots	30/03/2024			15/07/2024	150		12/12/2024	Dossier transmis pour publication à la DCCMEF
10	DCET	91 205 000		91 205 000	Acquisition et pose de climatiseurs	Fourniture	DPX	DPX N° 006/24 en 02 lots	30/03/2024	13/04/2024		09/07/2024	150		06/12/2024	Marché en cours d'exécution
11	DPE	16 800 000		16 800 000	Acquisition de compresseur d'air et de surpresseur pour la centrale	Fourniture	DCF	DCF N° 4 en 3 lots	12/02/2024	16/02/2024		30/03/2024	90		28/06/2024	Marché en cours d'exécution
12	AC	4 250 000		4 250 000	Acquisition de compresseurs et de détecteurs de faux billets	Fourniture	DCF	AT/CW/000457/D M du 21/03/24, Cotation n°11/2024	12/02/2024	21/03/2023		30/03/2024	90		28/08/2024	Marché en signature
13	DIPI	2 000 000 000		2 000 000 000	Electrifications de nouvelles localités	Travaux	AOI		30/03/2024			15/07/2024			12/12/2024	Marché en cours d'exécution
14	DT	50 000 000		50 000 000	Mise en parallèle du troisième Transformateur au poste de Patte d'Oie	Travaux	DPX	N/A	30/03/2024	N/A		09/07/2024			07/09/2024	Marché exécuté



N° ORDRE	CENTRE BUDGETAIRE	Montant de l'inscription budgétaire en F CFA HTVA (1)	Montant des dépenses engagées non liquidées en F CFA HTVA (2)	Disponible en F CFA HTVA (3) = (1) - (2)	Nature des prestations (objet du contrat en perspective)	Type de Prestation	Type de Prestation	Réf. du Dossier d'Appel à Concurrence	PUBLICATION DE L'AVIS	Date réelle ouverture des offres	Date de démarrage	Délai d'exécution / en jours		Date butoir	Observations
												Date prévue PPM	Date prévue		
15	DT	615 000 000		615 000 000	Acquisition de quatre (04) BPN 15 kV et équipements d'essais de BPN (Bobine de Point Neutre)	Travaux	AO	AO N° 40/2024 en 04 lots	30/03/2024	16/05/2024	15/07/2024	150	150	12/12/2024	Analyse en cours
16	DCET	114 318 000		114 318 000	Acquisition de PMU (Phasor Measurement Unit)	Fourniture DPX	AO	DPX 013/2024 en lot unique	30/03/2024	N/D	15/07/2024	150	150	12/12/2024	Marché en signature
17	DCET	300 000 000		300 000 000	Acquisition de multiplexeurs optiques SDH de Zano et Ouaga 1	Fourniture	AO	AO 008/2024 en 3 lots	30/03/2024	22/04/2024	15/07/2024	150	150	12/12/2024	Marché en cours d'exécution
18	DT	648 210 000		648 210 000	Acquisition de cellules HTA	Fourniture	AO	AO 13/2024	30/03/2024	19/04/2024	15/07/2024	150	150	12/12/2024	Résultat transmis pour publication
19	PEDECEL	475 102 130		475 102 130	Contrôle et surveillance des Travaux	Prestations intellectuelles	DP	DPKO N°001/2023/ SONABEL / PEDECEL	30/03/2024	22/02/2024	15/07/2024	150	150	12/12/2024	Marché en cours d'exécution
20	PEDECEL	100 000 000		100 000 000	Elaboration de notice d'impact environnemental et social	Prestations intellectuelles	DP		30/03/2024	Provision constituée	15/07/2024	150	150	12/12/2024	Provision constituée pour remplacement de localités éventuelles
21	DT	1 000 000 000		1 000 000 000	Acquisition de conducteurs HTB pour la Direction du Transport	Fourniture	AOI	AO 039/2024	30/03/2024	16/05/2024	15/07/2024	150	150	12/12/2024	Marché en signature
22	DT	1 000 000 000		1 000 000 000	Acquisition de 10 pylônes (Tours ENS) de dépannage	Fourniture	ED	ED	N/A	N/A	30/03/2024	180	180	26/09/2024	Marché en cours d'exécution
23	DETD	1 933 728 676		1 933 728 676	Extension Réseau et Equipements de réseaux pour restructuration du réseau de distribution à Ouaga	Travaux	AOI	AOO N° 022 en 5 lots	21/03/2024	08/05/2024	27/05/2024	300	300	23/12/2024	Marché en signature
24	PT-BOBO	30 000 000		30 000 000	Acquisition et pose de quatre extracteurs d'air sur le toit de la nouvelle salle des machines pour évacuation de la chaleur des chaudières BOBO II	Fourniture	DPX	DPX 014/2024	30/03/2024	13/03/2024	30/05/2024	120	120	27/10/2024	Marché en cours d'exécution
25	SDBO	347 000 000		347 000 000	Transformation du bâtiment de l'ancienne centrale de BOBO I en magasin	Travaux	AO	AAOO 49/2024	30/03/2024	10/06/2024	15/07/2024	180	180	13/10/2024	Dossier annulé
26	DDC	150 000 000		150 000 000	Construction de bureaux pour le service TST- HTA	Travaux	AO	AO N° 048/2024	30/03/2024	03/06/2024	15/07/2024	150	150	12/12/2024	Transmis pour publication des résultat à la DCCMEF
27	DDC	350 000 000		350 000 000	Construction et équipement d'un laboratoire TST AU BURKINA FASO	Travaux	AO	AO N° 025/2021 AO N° 05/2024 AO N° 059/2024 Relance de AO N° 025/2024	30/03/2024	13/05/2024 1/07/2024	15/07/2024	150	150	12/12/2024	AO-54: Transmis pour publication des résultat à la DCCMEF; AO-25: Infructueux AO-54: relance de AO-25
28	PT-KOSSODO 1	725 000 000		725 000 000	Travaux d'assainissement de la centrale de KOSSODO	Travaux	AO	AO 42/2024	30/03/2024	28/05/2024	15/07/2024	150	150	12/12/2024	Marché en cours d'exécution
29	P5-ZAGTOULI	157 560 000		157 560 000	Bâtiment pour bureaux pour la centrale de Zagtoouli	Travaux	AO	DPx N° 029/2024	30/03/2024	03/05/2024	15/07/2024	150	150	12/12/2024	Marché en cours d'exécution



N° ORDRE	CENTRE BUDGETAIRE	Montant de l'inscription budgétaire en F CFA HTVA (1)	Montant des dépenses engagées non liquidées en F CFA HTVA (2)	Disponible en F CFA HTVA (3) = (1) - (2)	Nature des prestations (objet du contrat en perspective)	Type de Prestation	Type de Prestation	Raf. du Dossier d'Appel à Concurrence	PUBLICATION DE L'AVIS	Date réelle ouverture des offres	Date de démarrage		Délai d'exécution / en jours		Date butoir	Observations
											Date prévue	Date prévue	Délai d'exécution prévu / en jours	Délai d'exécution prévu / en jours		
30	DP	250 000 000		250 000 000	Délimitation des couloirs de lignes de la DUP	Travaux	AO		30/03/2024		15/07/2024		150		12/12/2024	Provision constituée au besoin
31	DA	248 015 129		248 015 129	Travaux de construction d'hangar, d'atelier, bétonnage air de stockage et d'un local pour les agents de sécurité	Travaux	AO	DPX N° 026/2024	30/03/2024	30/04/2024	15/07/2024		150		12/12/2024	Marché en cours d'exécution
32	SDBO	210 597 170		210 597 170	Travaux de construction de passage de câbles, de vestiaires et de clôture	Travaux	AO	AO N° 047/24 (lot-1 Vivianne)	30/03/2024		15/07/2024		150		12/12/2024	Résultat publié; recours à l'ARCOP (resultat infirmé); Analyse à reprendre;
33	DPE	978 431 098		978 431 098	Travaux divers de génie civil	Travaux	AOI	AO N° 047/2024 AO N° 053/2024 DPX N° 027/2024	30/03/2024	AO n° 053/2024 (23/05/2024) AO n° 047/2024 (27/05/24) DPX n° 027/2024 (14/05/2024)	15/07/2024		150		12/12/2024	DPX-27: Marché en signature; AO-53: Marché en signature; AO-47: Résultat publié; recours à l'ARCOP (resultat infirmé); Analyse à reprendre;
34	DGC	30 000 000		30 000 000	Réalisation de forages positifs	Travaux	DPX	DPX 023/2024	30/03/2024	12/04/2024	30/05/2024		120		26/12/2024	Marché en cours d'exécution
35	DPE	840 000 000		840 000 000	Acquisition d'équipements divers pour les centrales	Fourniture	AOI	AO 007/2024 en 5 lots	30/03/2024	27/05/2024	15/07/2024		150		12/12/2024	Marché en cours d'exécution
36	DCET	882 000 000		882 000 000	Fourniture installation et mise en service d'un lien de transmission optique sur les lignes 33kV Bobo1-Kua, Kua-Kodeni, Bobo1-Bobo2	Fourniture	AO	AO 012/2024 en 2lots	30/03/2024	N/D	15/07/2024		150		12/12/2024	Marché en cours d'exécution
37	DIRS	1 555 723 500		1 555 723 500	Acquisition de divers licences & Logiciels	Fourniture	AOI	(1) AO 005/2024 (2) cotations n° 012/2024 (3) cotations n° 028/2024	30/03/2024	(1) 02/08/2024 (2) 05/06/2024 (3)	15/07/2024		150		12/12/2024	En cours d'analyse
38	DPA	54 842 946		54 842 946	Acquisition de Matériel & Outillages spécifiques du Garage auto (voir outillage)	Fourniture	DPX	DPX 18/2024 en 2 lots	30/03/2024	N/D	30/05/2024		150		27/10/2024	Marché en cours d'exécution
39	DS	188 500 000		188 500 000	Acquisition des outillages spécifiques et Matériel de distribution	Fourniture	AO	AO 030/2024	30/03/2024	N/D	15/07/2024		120		12/12/2024	Marché en cours d'exécution
40	DPTAC	75 000 000		75 000 000	Intégration des départs au SCADA	Fourniture	DPX	DPX 012/2024	30/03/2024	N/D	30/05/2024		180		27/10/2024	Marché en signature
41	DPTAC	329 000 000		329 000 000	Acquisition d'un bloc embellié pour un groupe électrogène et de deux cellules avec disjoncteur 15 kV pour le G4 et la BPN	Fourniture	AO	AO 46 en 03 Lots	30/03/2024		15/07/2024		150		12/12/2024	Dossier à transmettre à la DGCMEF



N° ORDRE	CENTRE BUDGETAIRE	Montant de l'inscription budgétaire en F CFA HTVA (1)	Montant des dépenses engagées non liquidées en F CFA HTVA (2)	Disponible en F CFA HTVA (3) = (1) - (2)	Nature des prestations (objet du contrat en perspective)	Type de Prestation	Type de Prestation	Réf. du Dossier d'Appel à Concurrence	PUBLICATION DE L'AVIS	Date réelle ouverture des offres	Date de démarrage	Délai d'exécution / en jours		Observations
												Date prévue	Délai d'exécution prévu / en jours	
42	DPE	153 500 000		153 500 000	Acquisition divers matériel d'atelier production	Fourniture	AO	DPX 25/2024 en 3 lots	30/03/2024	ND	15/07/2024	150		Infructueux; pour insuffisance de Budget
43	DCET	357 000 000		357 000 000	Acquisition de Matériel d'Atelier Transport	Fourniture	AO	AO 009/2024 en 02 lots	30/03/2024	01/07/2024	15/07/2024	150		Marché en signature
44	DA	8 400 000		8 400 000	Cracheur pression d'eau électrique	Fourniture	DCF	Cotation n° 008/2024	12/02/2024	13/05/2024	30/03/2024	90		Infructueux;
45	PT-BOBO	60 000 000		60 000 000	Matériels de laboratoire	Fourniture	DPX	DPX 20/2024	30/03/2024	N/D	30/05/2024	150		Marché en signature
46	AC	19 000 000		19 000 000	Acquisition de Matériel de manutention	Fourniture	DCF	AO 030/2024	30/03/2024	N/D	30/03/2024	90		Marché en cours d'exécution
47	DS	16 500 000		16 500 000	Acquisition d'outillage et de matériels de sécurité	Fourniture	DPX	AO 030/2024	30/03/2024	N/D	30/05/2024	120		Marché en cours d'exécution
48	DDAC	114 920 771		114 920 771	Fourniture et pose de 150 pièces Détecteurs de Défaut Aérien(DDA) sur les lignes HTA de la DRCE	Fourniture	DPX	DPX 008/2024	30/03/2024	N/D	15/07/2024	180		Marché en cours d'exécution
49	DIRS	119 000 000		119 000 000	Acquisition de petits matériels informatique	Fourniture	AO	DPX 016/2024 en 03 lots	30/03/2024	29/03/2024	15/07/2024	150		Marché en cours d'exécution
50	DPH	8 250 000		8 250 000	Acquisition de Matériel Métrologique	Fourniture	DCF	DC 005/2024 en 2 lots	12/02/2024	N/D	30/03/2024	90		Marché en cours d'exécution
51	DME	30 000 000		30 000 000	Equipement en matériels audio-visuels de la salle de réunion de la DTME	Fourniture	DPX	DPX 0010/2024 en lot unique	30/03/2024	30/04/2024	30/05/2024	150		Infructueux
52	DP	8 100 000		8 100 000	Matériel de Transport motos	Fourniture	DCF	DC 007/2024 en lot unique	12/02/2024	N/D	30/03/2024	90		Marché suspendu
53	DIRS	107 600 000		107 600 000	Acquisition de Onduleurs & batteries	Fourniture	AO	DPX 009/2024 en 4 lots	30/03/2024	05/03/2024	15/07/2024	150		Marché en cours d'exécution
54	DCET	600 000 000		600 000 000	Fourniture, installation et mise en service d'ordinateurs industriels et la mise à jour de Microsada ABB des postes de Kossodo, Ouaga 1, Ouaga 2 et Ouaga 2000	Fourniture	AO	AO 040/2023	30/03/2024	N/D	15/07/2024	210		Marché en cours d'exécution
55	DS1	736 381 920		736 381 920	Acquisition de matériels informatique	Fourniture	AO	AO 29/2024	30/03/2024	17/06/2024	15/07/2024	150		Marché en signature
56	DIRS	21 500 000		21 500 000	Acquisition de matériels et équipement de communication	Fourniture	DPX	DPX 22 en 02 Lots	30/03/2024		30/05/2024	150		Cotation en signature
57	DDC	761 579 861		761 579 861	Travaux de construction, d'extension et restructuration EP	Travaux	AO	AOOI N° 023 en 6 lots	30/03/2024	10/05/2024	15/07/2024	300		Infructueux
58	DDC	1 205 317 104		1 205 317 104	Restructuration et Réhabilitation du réseau HTA/BT et Extension du reseau HTA/BTA dans les Directions régionales	Travaux	AOI	DAO 034/2024	30/03/2024	09/05/2024	15/07/2024	150		Marché en signature
59	DIP1	5 000 000 000		5 000 000 000	Etudes de faisabilité des projets majeurs	Travaux	DP/MI		30/03/2024		15/07/2024	150		Dossier non reçu
60	DD	1 250 000 000		1 250 000 000	Renforcement d'urgence des réseaux HTA/BT et Extension HTA/ BT	Travaux	AOI	AO 033/24	30/03/2024	06/06/2024		90		Infructueux



N° ORDRE	CENTRE BUDGETAIRE	Montant de l'inscription budgétaire en F CFA HTVA (1)	Montant des dépenses engagées non liquidées en F CFA HTVA (2)	Disponible en F CFA HTVA (3) = (1) - (2)	Nature des prestations (objet du contrat en perspective)	Type de Prestation	Type de Prestation	Réf. du Dossier d'Appel à Concurrence	PUBLICATION DE L'AVIS		Date réelle ouverture des offres		Date de démarrage		Délai d'exécution / en jours	Date butoir	Observations
									Date prévue PPM	Date prévue	Date prévue	Date prévue	Date prévue	Date prévue			
61	DIRS	172 000 000		172 000 000	Renforcement de la sécurité des réseaux informatiques	Travaux	AO	DPX 011/24	30/03/2024	13/04/2024	15/07/2024	150	12/12/2024	Marché en cours d'exécution			
62	DPER	2 500 000		2 500 000	Station de travail Précision 3440 avec licence Indigovision installée avec 2 moniteurs	Fourniture	DCF	DC 003/2024	12/02/2024	22/02/2024	30/03/2024	90	28/06/2024	Marché en signature			
63	DIRS	385 047 200		385 047 200	Acquisition de système de vidéoconférence et de divers matériels audio-visuels	Fourniture	AO	DPX 17/2024 en 2 lots DPX 028/2024 en lot unique	30/03/2024	DPX 17/2024 : 14/03/2024 DPX 28/2024 : 30/04/2024	15/07/2024	150	12/12/2024	Marché en cours d'exécution			
64	DP	2 754 250 000		2 754 250 000	Acquisition de terrain aménagés, bâtis et nus	Fourniture	ED	ED	N/A	N/A	30/03/2024	270	25/12/2024	Marché en cours d'exécution			
65	DDC	2 230 528 095		2 230 528 095	Acquisition de matériels de réseaux pour les travaux période chaude 2024	Fourniture	AOI	Entente directe	30/03/2024	15/07/2024	150	12/12/2024	Marché en cours d'exécution				
66	SDBO	3 281 380 415		3 281 380 415	Acquisition d'équipements de transformateurs de puissance (activités de la pointe 2024)	Fourniture	ED	ED 003/2024	30/03/2024	N/A	0	150	12/12/2024	Marché en cours d'exécution			
67	DP	3 539 100 000		3 539 100 000	Acquisition de Véhicules automobiles	Fourniture	AOI	AO 015/2024	30/03/2024	15/07/2024	150	12/12/2024	Marché en cours d'exécution				
68	DP	511 000 000		511 000 000	Acquisition de Véhicules spécifiques	Fourniture	AO	AO 038/2024	30/03/2024	15/07/2024	150	12/12/2024	Marché en cours d'exécution				
69	DIRS	277 500 000		277 500 000	Fourniture et pose d'un système de vidéo surveillance pour les guichets de Banfora, Centrale de BOBO II et DACI	Fourniture	AO	AO 041/2024	30/03/2024	N/D	15/07/2024	180 jours pour le lot 1 et 150 jours pour les lots 2 et 3	12/12/2024	Analyse en cours			
70	DIRS	49 194 730		49 194 730	Complémentaire Credit 22E0024,Construction lignes EP SONABEL-Rond -point Gendarmerie,Gendarmerie- Stade Stade municipal, Palais de justice de LEO	Travaux	DPX	AO 41/2022 Lot n°6	30/03/2024	30/05/2024	210	26/12/2024	Marché en cours d'exécution				
71	DIRS	140 000 000		140 000 000	Complément du crédit 23E007R pour l'acquisition des 7 PICK-UP nacelles 4X4, Une nacelle par direction régionale et une pour DDC et DETD pour les travaux d'éclairage public SMRT	Fourniture	AO	AO 88/2023	30/03/2024	15/07/2024	150	12/12/2024	Marché en cours d'exécution				
72		182 605 000		182 605 000	Mise en réseau des interfaces CPL HT, la fourniture, l'installation et la mise en service d'un outil de supervision du réseau CPL de la SONABEL	Travaux	AO		15/03/2024	14/04/2024	12/08/2024	60	11/10/2024	Marché en cours d'exécution			
73		75 358 000		75 358 000	Installation de circuit onduleur fourniture et installation d'un onduleur de 30 kVA Fourniture et installation des systèmes de contrôle d'accès et de vidéosurveillance ; câblage et installation de réseau informatique fourniture et installation d'un système de visioconférence	Travaux	DPX		31/01/2024	16/05/2024	29/06/2024	60	28/04/2025	Marché exécuté			
74		735 000 000		735 000 000	Acquisition divers auxiliaires des groupes	Fourniture	AO		30/09/2024	30/10/2024	27/02/2025	60	28/04/2025	Dossier à lancer			



N° ORDRE	CENTRE BUDGETAIRE	Montant de l'inscription budgétaire en F CFA HTVA (1)	Montant des dépenses engagées non liquidées en F CFA HTVA (2)	Disponible en F CFA HTVA (3) = (1) - (2)	Nature des prestations (objet du contrat en perspective)	Type de Prestation	Type de Prestation	Raf. du Dossier d'Appel à Concurrence	PUBLICATION DE L'AVIS	Date réelle ouverture des offres	Date de démarrage	Délai d'exécution / en jours		Date butoir	Observations
												Date prévue PPM	Date prévue		
75		2 020 231 000		2 020 231 000	Maintenance générale des vannes et de la turbine du GI, entretien des réfrigérants des alternateurs et des vérins de freinage des groupes de la centrale hydroélectrique de Bagré	Travaux	AOI		15/10/2024	14/11/2024	12/02/2025	60		13/04/2025	Dossier à lancer
76		618 788 658		618 788 658	Travaux divers de génie civil	Fourniture	AO		15/10/2024	14/11/2024	12/02/2025	120		12/06/2025	Dossier à lancer
77		2 110 055 738		2 110 055 738	Acquisition de groupes électrogènes	Fourniture	AO		30/09/2024	30/10/2024	27/02/2025	60		28/04/2025	Dossier à lancer
78		1 076 097 723		1 076 097 723	Assistance pour la maintenance des centrales photo voltaïque (avenants)	Fourniture	ED		10/05/2024	25/05/2024	09/07/2024	60		07/09/2024	Marché en cours d'exécution
79		1 879 681 785		1 879 681 785	Reboinage des alternateurs des groupes G4 G5 et G7 de la centrale de Komsilga	Fourniture	ED		15/07/2024	30/07/2024	13/09/2024	60		12/11/2024	Marché en signature
80		360 201 405		360 201 405	Remplacement des accouplements et soufflets de 2 GE MAK	Fourniture	ED		18/08/2024	02/09/2024	17/10/2024	60		16/12/2024	Marché en signature
81		775 000 000		775 000 000	Acquisition de cinq (05) camions citernes complémentaires pour faire face aux besoins d'approvisionnements accrus des centrales extérieures en vue de préparer la pointe 2025	Fourniture	AO		30/09/2024	30/10/2024	27/02/2025	60		28/04/2025	Dossier à lancer
82		394 067 797		394 067 797	Acquisition d'une fourchette de 40 tonnes pour la manutention des ISO Conteneurs de GNL	Fourniture	AO		30/09/2024	30/10/2024	27/02/2025	60		28/04/2025	Dossier à lancer
83		764 150 000		764 150 000	Installation de cinq (05) ponts basculer en vue d'une quantifions plus fiable du combustible livré par camions citernes dans les centrales de KONSILCA 1, KOSSODO 2, OUAGA 2 et FIESS, OUAGA 1 ET MGP	Fourniture	AO		30/09/2024	30/10/2024	27/02/2025	60		28/04/2025	Dossier à lancer
84		2 613 508 248		2 613 508 248	Acquisition et installation de six (06) cuves de stockage de combustible à KOUPELA et à GONSIN en vue de préparer la pointe de 2025	Travaux	AOI		15/10/2024	14/11/2024	14/03/2025	90		12/06/2025	Dossier à lancer
85		199 037 950		199 037 950	Fourniture des pièces de rechange des équipement DWDM MPLS et de fibre optique à la SONABEL/ AOI n°076/2023 du 19/10/2023/lorvne SA	Fourniture	AO		30/09/2024	30/10/2024	27/02/2025	60		28/04/2025	Dossier à lancer
86		475 715 342		475 715 342	Acquisition de Matériel Informatique	Fourniture	AO		30/09/2024	30/10/2024	27/02/2025	60		28/04/2025	Dossier à lancer
87		279 216 000		279 216 000	Acquisition de Mobilier de bureau pour la mise en oeuvre du nouvel organigramme	Fourniture	AO		30/09/2024	30/10/2024	27/02/2025	60		28/04/2025	Dossier à lancer
88		197 924 265		197 924 265	Acquisition d'onduleurs pour les cérémonies d'envergure nationale.	Fourniture	AO		22/04/2024	22/05/2024	20/08/2024	80		18/11/2024	Marché en cours d'exécution
89		131 641 331		131 641 331	Fourniture, installation et mise en service d'un BAC réservoir de stockage de combustible	Fourniture	DPX		30/09/2024	16/05/2024		80		27/02/2025	Dossier à lancer



N° ORDRE	CENTRE BUDGETAIRE	Montant de l'inscription budgétaire en F CFA HTVA (1)	Montant des dépenses engagées non liquidées en F CFA HTVA (2)	Disponible en F CFA HTVA (3) = (1) - (2)	Nature des prestations (objet du contrat en perspective)	Type de Prestation	Type de Prestation	Réf. du Dossier d'Appel à Concurrence	PUBLICATION DE L'AVIS	Date réelle ouverture des offres	Date de démarrage	Délai d'exécution / en jours	Date butoir	Observations
									Date prévue PPM	Date prévue	Date prévue	Délai d'exécution prévu / en jours		
90		91 000 000		91 000 000	Acquisition de divers matériels et outillages DIFO DPX 019/2024	Fourniture	DPX		10/05/2024	16/05/2024	08/08/2024	60	07/10/2024	Marché en cours d'exécution
91		29 376 500		29 376 500	Création de 2 postes sur portique a la section AD de Poura et AL de Fara	Fourniture	DPX		30/09/2024	16/05/2024	29/12/2024	120	27/02/2025	Dossier à lancer
92		1 925 462 151		1 925 462 151	Délimitation du couloir de la future ligne 90 kV double terre Kosodo-Ouaga Est-Patte d'Oie et Indemnisation des PAP	Travaux	ED		15/07/2024	30/07/2024	13/09/2024	60	12/11/2024	Provision
93		198 240 000		198 240 000	Travaux d'électrification des cités AGB à Zaken (Saaba) et de Kamboinsin (Ouaga)	Fourniture	DPX	DPX N°032/2024	04/07/2024	09/07/2024	02/10/2024	120	30/01/2025	Marché en signature
94		472 000 000		472 000 000	Renforcement de liaison 33 kV Ouaga 2000-Komsilga	Fourniture	AO	AAOON° 002/24	04/03/2024	03/04/2024	01/08/2024	120	29/11/2024	Dossier infructueux, relanceAAOO N° 060/2024
95		6 350 000 000		6 350 000 000	Réalisation des travaux de construction de la liaison 161 kV Kompienga-Mandouri.	Fourniture	AOI	AAOOI N° 050/24	04/07/2024	09/07/2024	01/11/2024	120	01/03/2025	Rapport en signature
96		28 000 000 000		28 000 000 000	Renforcement du réseau National Interconnecté Phase 1	Fourniture	ED		15/07/2024	30/07/2024	13/09/2024	60	12/11/2024	Dossier à lancer
97		156 525 424		156 525 424	Acquisition de trois (03) véhicules berline et de sept (07) véhicules SUV	Fourniture	AOR		30/09/2024	16/05/2024	29/12/2024	120	27/02/2025	Dossier à lancer
98		844 413 001		844 413 001	Complément du 23B138 et 23B140 pour la fourniture, l'installation et la mise en service d'un système de transmission haut débit par fibres optiques ADSS sur les liaisons : CNC-ZAD-Siège-Ouaga 1-Ouaga 2 et Kodenli-DRO de la SONABEL	Fourniture	AO		04/05/2024	03/06/2024	01/09/2024	120	30/12/2024	Marché en cours d'exécution
		96 341 014 544		96 341 014 544										



II. BUDGET D'EXPLOITATION FONDS PROPRES 2024 - Révisé-

N° d'ordre	NIVEAU 1	Montant de l'inscription budgétaire en F CFA HTVA (1)	Montant des dépenses engagées non liquidées en F CFA HTVA (2)	Disponibles en F CFA HTVA (3) = (1) - (2)	Nature des prestations (objet du contrat en perspective)	Mode de passation	Réf. du Dossier d'Appel à Concurrence	Publication par DGCMEF de l'AVIS Date réelle et référence de la revue	Date de remise des offres		Délai d'exécution en JOURS	Date butoir	OBSERVATIONS
									Date réelle				
1	DPA	1 528 421 787		1 528 421 787	Fournitures de transformateurs et de postes préfabriqués	Fourniture	ED	15/03/2024	22/02/2024		120	12/12/2024	Marché en cours d'exécution
2	DPA	3 105 503 226		3 105 503 226	Achats de compteurs d'énergie	Fourniture	AO 004/2024	Quotidien 3876 du 10/05/2024	05/07/2024		180 JOURS INFRUCTUEUX	12/12/2024	Récours auprès de l'ARCOP résultat confirmé
3	DPA	441 487 441		441 487 441	Achats de disjoncteurs de branchement	Fourniture	AO 037/2024 en 02 Lots	Quotidien N°3838 19/03/2024	06/05/2024		150	12/12/2024	Rapport en signature
4	DPA	1 868 253 459		1 868 253 459	Achats de câbles BT	Fourniture	AO 020/2024	Quotidien N° 3838 du mardi 19/03/2024	03/05/2024		150	12/12/2024	Transmis à la DGCMEF pour publication
5	DPA	749 447 266		749 447 266	Achats de câbles HTA	Fourniture	AOI 035/2024 en 02 Lots	Quotidien N°3856 12/04/2024	14/05/2024		150	12/12/2024	Marché en signature
6	DPA	1 818 238 449		1 818 238 449	Fourniture de supports HEA, HEB Candélabres et supports Tubulaires	Fourniture	AOI 016/2024	19/03/2024 N° 3838 du 19/03/2024	20/05/2024		120	12/12/2024	Marché en signature
7	DPA	1 820 061 655		1 820 061 655	Achat d'accessoires de réseau de distribution	Fourniture	AO 021/2024	Quotidien n°3848 du 02 avril 2024	21/05/2024		120	12/12/2024	Résultat transmis pour publication
8	DPA	1 521 798 622		1 521 798 622	Fournitures de luminaires	Fourniture	AOI 018/2024	02/04/2024 N° 3849 du 03/04/2024	20/05/2024		90	12/12/2024	Dossier en cours d'analyse
9	DPA	2 659 377 671		2 659 377 671	Fournitures de poteaux béton	Fourniture	AO 017/2024	02/04/2024 N° 3848 du 02/04/2024	17/05/2024		120	12/12/2024	Résultat transmis pour publication
10	DPE	8 178 264 583		8 178 264 583	Achats stockés DDO & GASOIL pour les centrales	Fourniture	ED	01/03/2024	N/A		30	28/06/2024	Marché en cours d'exécution
11	DPE	35 664 875 519		35 664 875 519	Achats stockés FUEL pour les centrales	Fourniture	ED	-	N/A		30	28/06/2024	Marché en cours d'exécution
12	DPE	1 177 405 766		1 177 405 766	Fournitures d'huiles pour les centrales	Fourniture	ED	01/03/2024	N/A		30	28/06/2024	Marché en cours d'exécution
13	DPE	5 340 345 344		5 340 345 344	Achats stockés pièces de rechanges groupes / centrales KOSSODO II	Fourniture	ED 001/2024	14/03/2024	N/A		90	28/09/2024	Marché en cours d'exécution
14	DPE	1 999 101 850		1 999 101 850	Achats stockés pièces de rechanges groupes / centrales KOMSILGA	Fourniture	ED 002/2024	14/03/2024	N/A		90	28/09/2024	Marché en cours d'exécution
15	DPE	9 499 000 000		9 499 000 000	Achats stockés pièces de rechanges groupes / centrales BOBO II	Fourniture	ED	14/03/2024	N/A		90	28/09/2024	Marché en cours d'exécution



N° d'ordre	NIVEAU 1	Inscrit budgétaire en F CFA HTVA (1)	dépenses engagées non liquidées en F CFA HTVA (2)	disponibles F CFA HTVA (3) = (1) - (2)	Nature des prestations (objet du contrat en perspective)	Mode de passation	Réf. du Dossier d'Appel à Concurrence	Publication DGCMEF de l'AVIS Date réelle et référence de la revue	Date des offres		Délai d'exécution en JOURS	Date butoir	OBSERVATIONS
									Date réelle	Date			
16	DPE	2 033 465 103		2 033 465 103	Achats stockés pièces de rechanges groupes des centrales extérieures	Fourniture	ED	14/03/2024	N/A	90	26/09/2024	Marché en cours d'exécution	
17	DPA	238 374 284		238 374 284	Pièces de rechange Véhicules Stockées et non Stockées	Fourniture	Marchés en cours de signature AO 19/2023	Marchés en cours de signature AO 19/2023	N/A	90	12/12/2024	Marché en cours d'exécution	
18	DPA	893 448 760		893 448 760	Fournitures non stockées de bureaux, informatiques et petits matériels équipement et outillages divers	Fourniture	AO 036/2023	AO 036/2023	14/05/2024	90	12/12/2024	Résultat transmis pour publication	
19	DPA	558 369 700		558 369 700	Fournitures non stockées Huiles & Essence véhicules et de Combustibles & lubrifiants;	Fourniture	ED	-	N/A	30	29/04/2024	Marché en cours d'exécution	
20	DPA	161 558 000		161 558 000	Fournitures non stockées Petits Matériels et outillage divers / DIFO	Fourniture	AO 031/2024	QMP 3871 du 03/05/2024	03/06/2024	90	12/12/2024	Resultat transmis à la DGCMEF pour publication	
21	DPE	2 062 081 916		2 062 081 916	Fourniture de pièces de rechange non Stockables, Pièces de Rechange, de fournitures d'atelier, et autres fournitures, petits matériels et outillages divers des centrales	Fourniture	AO 019/2024		N/A	30	12/12/2024	Marché en cours d'exécution	
22	PPTME	3 036 469 678		3 036 469 678	Entretien, réparations bâtiments de centrale et Travaux d'entretiens production de la centrale de KOSSODO 1	Travaux	AO 010/2024 réduit en lot unique	Quotidien N° 3841 du 22/03/2024	22/04/2024	30	12/12/2024	Marché en de signature	
23	DPE	1 218 089 060		1 218 089 060	Entretien, réparations bâtiments de centrale et Travaux d'entretiens productiondes autres centrales	Travaux				30	12/12/2024	Provision	
24	DG / DCRP	623 050 000		623 050 000	Cadeaux à la clientèle; Autres charges de publicité et relations publiques	Fourniture	AO 026/2024	Quotidien N° 3838 du mardi 19/03/2024	18/04/2024	90	12/12/2024	Rapport d'analyse transmis en signature	
25	DPE	3 013 858 801		3 013 858 801	Achats stockés DDO	Fourniture	ED	01/03/2024	N/A	30	28/06/2024	Marché en cours d'exécution	
26	DPE	4 023 360 151		4 023 360 151	Achats stockés FUEL	Fourniture	ED	01/03/2024	N/A	30	28/06/2024	Marché en cours d'exécution	
27	DPE	476 943 555		476 943 555	Achats stockés huiles et graisses	Fourniture	ED	01/03/2024	N/A	30	28/06/2024	Marché en cours d'exécution	
28	DG	185 331 162		185 331 162	Achats divers équipement et pièces de réchanges	Fourniture	AO	14/03/2024	N/A	90	26/09/2024	Marché en cours d'exécution	
29	DM	22 500 000		22 500 000	Acquisition des chemises DACOTA	Fourniture	DPX	30/09/2024	05/10/2024	60	04/12/2024	Marcher à lancer	
30	DDC	9 071 300		9 071 300	Maintenance du camion laboratoire de recherches de défauts souterrains	Prestation	DCF	30/09/2024	05/10/2024	60	04/12/2024	Marcher à lancer	
31	PEDECEL	10 140 000		10 140 000	Examen du projet de manuel des procédures administratives	Prestation Intellectuelle	CC	14/03/2024	N/A	60	26/09/2024	Marché en cours d'exécution	
		95 937 694 109		95 937 694 109									



III. BUDGET FINANCEMENT EXTERIEUR 2024 - Révisé-

N°	Source de Financement	Montant budgétaire F CFA HTVA (1)	Capacités engagées non liquidées en F CFA HTVA (2)	Disponible en F CFA HTVA (3) = (1) - (2)	Nature des prestations (objet du contrat en perspective)	Mode de passation	Type de passation	Type de passation	Type de passation	Publication par DCCMEF de l'avis des offres / en jours	Temps nécessaire à l'évaluation des offres / en jours	Notification de l'attribution provisoire	Délai d'exécution prévu / en jours	Centre BUDGETAIRE	OBSERVATIONS
13	Financement B.E.I.	750 742 359	0	750 742 359	Travaux de construction de la centrale solaire de zagzouli 2	AO en Lot unique	AO	AO	AO	NA	3	28/02/2024	300	DGP_UCP_ZAG T2	DGP_UCP_ZAGT9
14	Financement B.A.D.	697 597 701	0	697 597 701	Contrôle et surveillance des Travaux	DP	Prestation Intellectuelle	DP	DP	30/04/2024	1	31/12/2023	360	PEDECEL	Contrat en cours de signature
15	Financement B.A.D.	4 011 322 587	0	4 011 322 587	Acquisition du matériel de branchement (Lot 1)	AOI en Lot unique	Fourniture	AOI	AOI	30/04/2024	1	13/08/2024	120	PEDECEL	DAO soumis au bailleur pour ANO
16	Financement B.A.D.	5 105 319 656	0	5 105 319 656	Acquisition du matériel de branchement (Lot 2)	AOI en Lot unique	Fourniture	AOI	AOI	30/04/2024	1	13/08/2024	120	PEDECEL	DAO soumis au bailleur pour ANO
17	Financement B.A.D.	1 348 602 000	0	1 348 602 000	Acquisition du matériel de branchement (Lot3)	AOI en Lot unique	Fourniture	AOI	AOI	30/04/2024	3	13/08/2024	120	PEDECEL	DAO soumis au bailleur pour ANO
18	Financement B.A.D.	100 000 000	0	100 000 000	Consultant IEC - genre	DP	Prestation Intellectuelle	DP	DP	31/03/2024	3	29/06/2024	150	PEDECEL	ANO sur la Short list reçu Dpro en cours de préparation
19	Financement B.A.D.	42 000 000	0	42 000 000	Appui technique aux groupements de femmes dans les six régions du projet	DPA	Prestation Intellectuelle	DPA	DPA	01/03/2024	3	31/03/2024	270	PEDECEL	Dossier technique non encore reçu
20	Financement B.A.D.	144 000 000	0	144 000 000	Acquisition d'un camion nacelle et de trois (03) Pick-Up	AO en Lot unique	Fourniture	AO	AO	01/03/2024	3	31/03/2024	270	PEDECEL	Non encore lancé
21	Financement B.A.D.	19 550 000	0	19 550 000	Acq. de matériel informatique (Imprimantes, équipements de visio-projection)	DPX en Lot unique	Fourniture	DPX	DPX	01/03/2024	3	31/03/2024	270	PEDECEL	Non encore lancé
22	Financement B.A.D.	13 119 140 000	0	13 119 140 000	Extension et restructuration de réseaux MT/BT avec éclairage public	AOI en Lot unique	Travaux	AOI	AOI	27/02/2024	3	15/08/2024	120	PEDECEL	Non encore lancé
23	Financement B.I.D.	1 311 914 000	0	1 311 914 000	Construction et équipement d'un LABO de simulation de conduite de réseau pour le CFP à OUAGA	AOI en Lot unique	Travaux	AOI	AOI	27/02/2024	3	15/08/2024	120	PEDECEL	Non encore lancé
24	Financement B.I.D.	262 382 800	0	262 382 800	Acquisition d'outillage et matériel de sécurité	AO en Lot unique	Fourniture	AO	AO	14/03/2023	3	31/08/2023	180	PEDECEL	Non encore lancé
25	Financement B.I.D.	6 231 591 500	0	6 231 591 500	Acquisition de matériels de branchement et équipements de comptage	AOI en Lot unique	Fourniture	AOI	AOI	27/03/2023	3	13/09/2023	450	PEDECEL	Non encore lancé
26	Financement B.I.D.	655 957 000	0	655 957 000	Acquisition et installation de portes préfabriqués avec des cellules motorisées, télécommandables par le Bureau Central de Conduite (BCC)	AOI en Lot unique	Fourniture	AOI	AOI	11/04/2023	3	28/09/2023	450	PEDECEL	Non encore lancé
27	Financement B.I.D.	393 574 200	0	393 574 200	Acquisition de matériel roulant d'exploitation	AO en Lot unique	Fourniture	AO	AO	17/03/2023	3	09/09/2023	450	PEDECEL	Non encore lancé



N°	Source de Financement	Montant budgétaire en F CFA HTVA (1)	Des dépenses engagées non liquidées en F CFA HTVA	Disponible en F CFA HTVA (3) = (1) - (2)	Nature des prestations (objet du contrat en perspective)	Mode de passation	Type de passation	Type de passation	Publication par DDCMTF de l'avis	Temps nécessaire à l'évaluation des offres / en jours	Notification de l'attribution provisoire	Délai d'exécution prévu / en jours	Date butoir	CENTRE BUDGETAIRE	OBSERVATIONS
28	Financement B.I.D.	98 393 550	0	98 393 550	Acquisition de matériel roulant pour le fonctionnement de l'UGP	AO en Lot unique	Fourniture	AO	20/02/2024	3	21/03/2024	270	16/12/2024	PEDECEL	Non encore lancé
29	Financement B.I.D.	1 016 733 350	0	1 016 733 350	Contrôle et surveillance des travaux d'extension et de reconstruction des réseaux MT / BT	DP/MI	Prestation Intellectuelle	DP/MI	01/03/2024		20/12/2024	10	30/12/2024	PEDECEL	Non encore lancé
30	Financement B.I.D.	327 978 500	0	327 978 500	Etude d'électrification de 300 nouvelles localités	DP/MI	Prestation Intellectuelle	DP/MI	16/03/2024		20/12/2024	10	30/12/2024	PEDECEL	Non encore lancé
31	Financement B.I.D.	65 595 700	0	65 595 700	Etude Baseline, MI-Terme Evaluation et Evaluation Finale	DP/MI	Prestation Intellectuelle	DP/MI	21/03/2024		20/12/2024	10	30/12/2024	PEDECEL	Non encore lancé
		81 944 901 859		81 944 901 859											

